Додаток 12
до Правил виконання маркшейдерських робіт під час розробки родовищ рудних та нерудних корисних копалин
(пункт 9 глави 5 розділу IV)

ПІКЕТАЖНИЙ ЖУРНАЛ

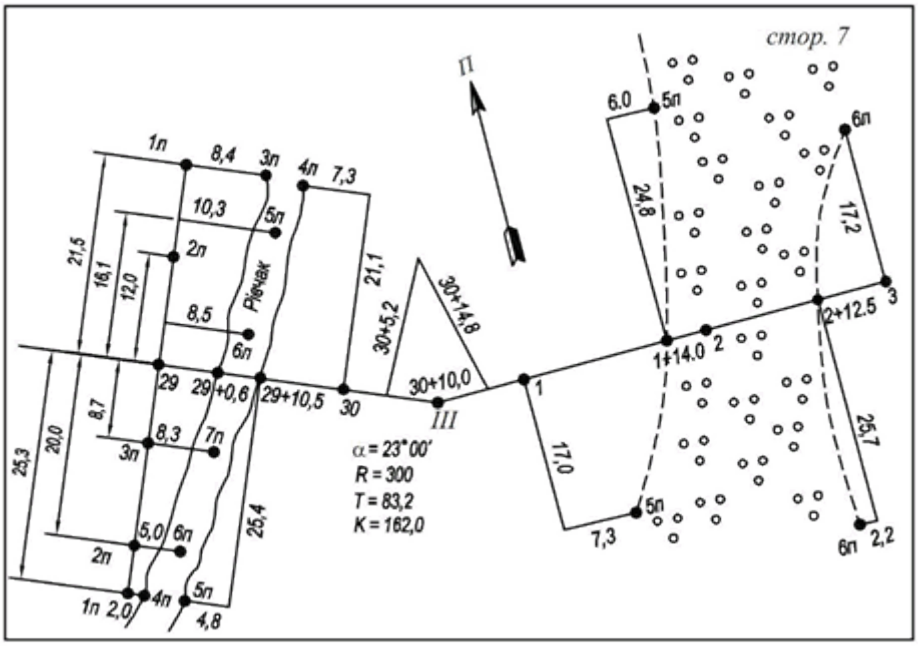

стор. 8

Нівелювання поперечного профіля

№ станції	Точки візування	Відліки за рейкою, см			Горизонт інструмента	Висотна відмітка, м	Примітка
		Задній	Передній	Проміжний			
	29	152			121,74	120,22	
	1п			279		118,95	
	2п			218		119,56	
	3п			284		118,90	Рівчак
	4п			289		118,85	Рівчак
	5п			232		119,42	Рівчак
	6п			179		119,95	Рівчак
	1п			040		121,34	
	2п			067		121,07	
	3п			093		120,81	
	4п			059		121,15	Рівчак
	5п			067		121,07	Рівчак
	6п			118		120,56	Рівчак
	7п			152		120,22	Рівчак
	30		245			1119,29	

Генеральний директор
директорату розвитку ринку
праці та умов оплати праці **Р. Овчаренко**
